s.i.a.ba.ve.

Contrat Aisne et Vesle axonaise

Avril 2014 – avril 2018

Comité de pilotage n°2

Maizy, le 5 avril 2016

- Bilan 2015
  - Bilan technique et financier
  - Bilan et retour d'expérience sur les classes d'eau élus

- Actions 2016
  - Comparaison entre les actions inscrites au contrat pour 2016 et les projets des maîtres d'ouvrage

- Bilan 1er avril 2016 (proche mi-contrat)

- Point d'information de l'Agence de l'Eau
  - Nouveau SDAGE 2016/2021
  - Programme de mesures
  - Révision du 10ème programme

Bilan 2015

2ème année du contrat

Les actions lancées en 2015

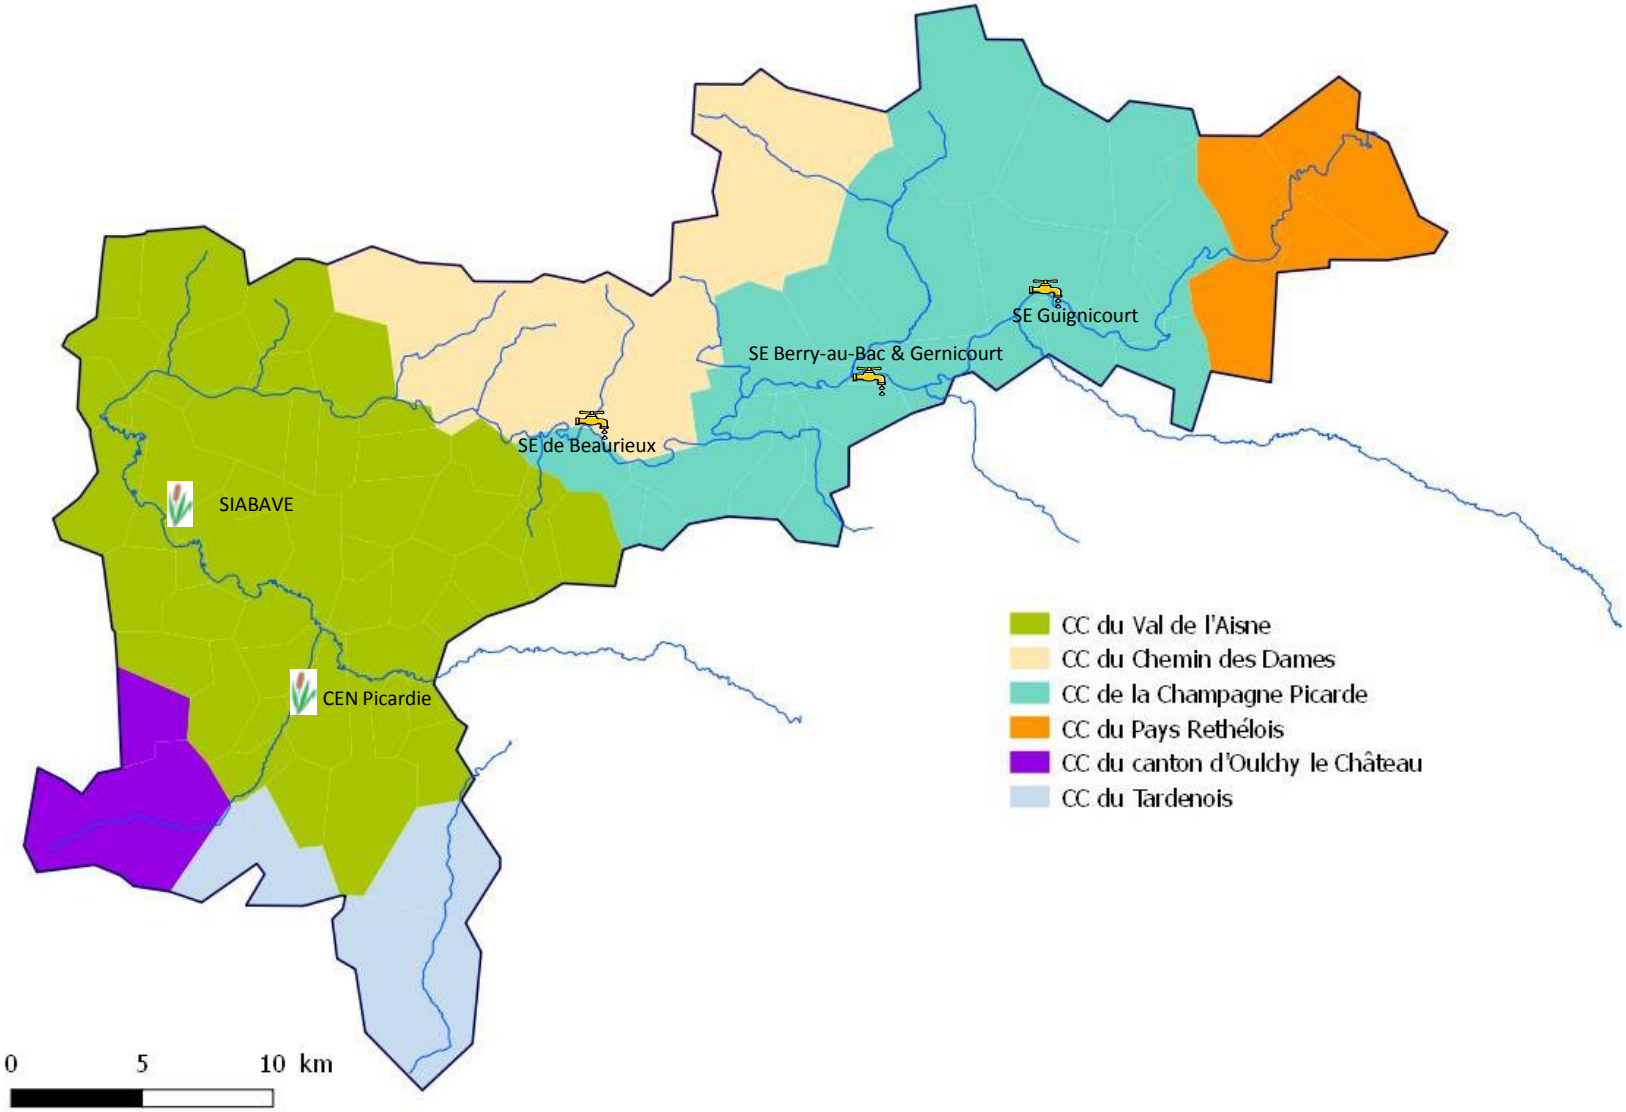

L'animation en 2015

Volet	2015
Zones humides	3 (sur 6 prévues) réunions de présentation aux maires de l'étude zones humides et des actions pouvant être menées en partenariat avec le CEN Picardie
Rivière	/
Eau potable	Réunions d'information sur la protection de la ressource eau potable à destination du grand public en partenariat avec l'ABP
Phytos en ZNA	1 réunion sur charte zéro phyto à destination des élus
Agriculture	- Accompagnement des collectivités pour l'introduction du bio dans les repas collectifs en partenariat avec l'ABP (en cours) - Organisation de réunions techniques « comment mieux pratiquer ? »
Artisanat et industrie	Participation aux formations pré-diagnostics des entreprises en partenariat avec la CCI et la CMA CCI : 2 réunions « Eau » (« Les systèmes de traitement des eaux applicables en industrie : Récupération des EP pour le process » et « Les systèmes de traitement des eaux applicables en industrie : Station d'épuration »)
Général	Organisation d'une classe d'eau à destination des élus (URCPIE)

Bilan financier 2015

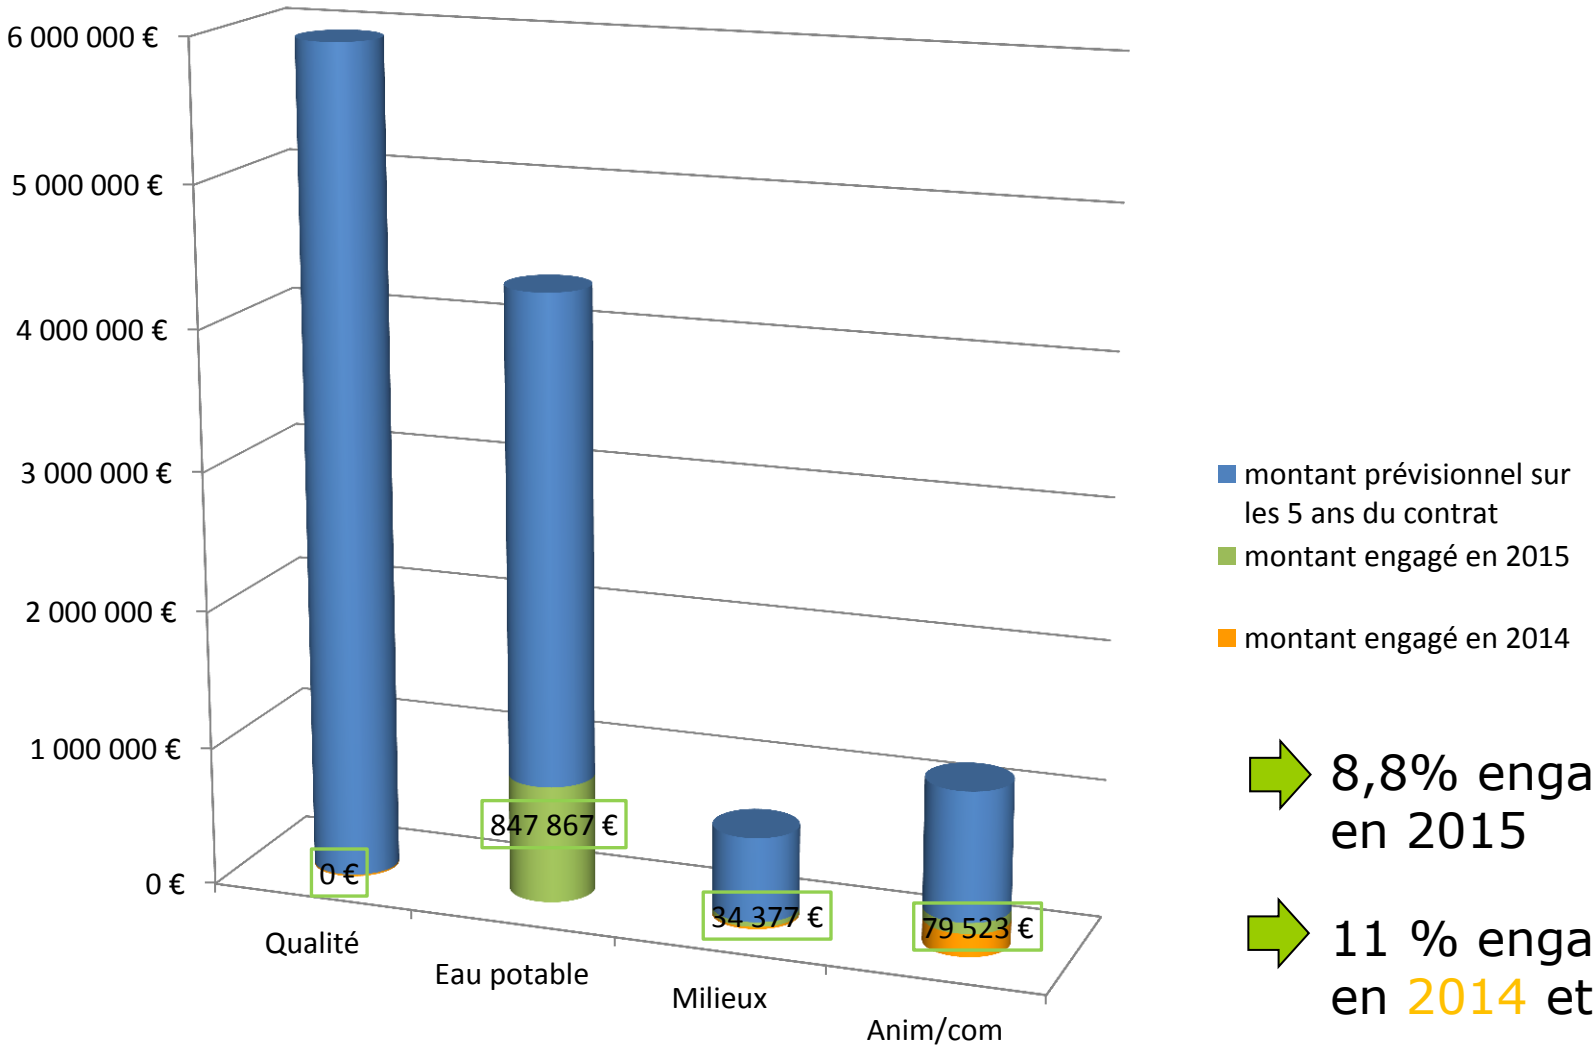

- 8,8% engagés en 2015
- 11 % engagés en 2014 et 2015

Classes d'eau élus

PICARDIE

5 journées dans l'Aisne :

- 15 janvier 2015 à Vailly-sur-Aisne : *« Rôle de l'élu dans la gestion de l'eau »*

- 29 janvier 2015 à Merlieux-et-Fouquerolles : « *La gestion durable des rivières, des zones humides et des espaces publics* »

Classes d'eau élus

PICARDIE

- 12 février 2015 à Berry-au-Bac et Witry-les-Reims :

« La gestion des eaux usées et des eaux pluviales »

Lors de la visite à Witry-les-Reims

Sur le terrain à Saint-Thomas

- 26 mars 2015 à Corbeny : *« Garantir l'alimentation en eau potable de qualité »*

La remise des cadeaux à la brasserie

- 23 avril à Chéry-Chartreuve :

« Bilan et perspectives »

Classes d'eau élus - bilan

PICARDIE

- 24 élus inscrits dont 13 du territoire du contrat AVA

- Elus satisfaits dans leur majorité
  - ✓ Evaluation :

Thématique	Programmation	Qualité des interventions	Nouvelles compétences acquises	Envie d'en savoir plus
% satisfaction	89%	90%	67%	70%

  - ✓ Retour d'expérience : M. RASERO, Pontavert

Classes d'eau élus - bilan

PICARDIE

- Exemples d'idées proposées:
  - Transmettre les nouvelles connaissances
  - 0 phytos : mettre en place un registre d'expériences et de contacts
  - Organiser une classe d'eau à destination des vendeurs de produits phytosanitaires
  - Réunir les agriculteurs et faire de l'information sur l'AB pour préserver la ressource
  - Organiser une classe d'eau mixte élus / employés communaux
  - Organiser une classe d'eau « niveau 2 » plus approfondie d'ici qq années

- Mise en place d'une info-mail spécifique à destination des participants de la classe d'eau (10 mails envoyés depuis septembre 2015)

Les actions prévues pour 2016

Eau potable

Maître d'ouvrage	Action	Masse d'eau	Avancement
SE de Chivres Val	Travaux de sécurisation de l'eau potable suite au SDAEP	3206 et 3003	SDAEP en cours
SE de Chivres Val	Travaux de protection et indemnisation des servitudes déclarées d'utilité publique	3206 et 3003	Réalisé en 2015
Vauxcéré	Travaux de protection et indemnisation des servitudes déclarées d'utilité publique	3106	Prévu pour 2016
Neufchâtel/Aisne	Diagnostic du réseau d'eau potable	3207	Relance de la commune
Mont-Notre-Dame	Raccordement du hameau du Mont banny	3106	Maître d'œuvre recruté
SE Vallée de la Vesle	Réhabilitation de la station de traitement	3207	Consultation des entreprises fin 2015
ReimsMétropole	Etude de l'Aire d'Alimentation du Captage d'Avaux	3207	Lancement en 2016
Vailly-sur-Aisne	Traitement du fluor	3206	Point à faire avec la commune
Vauxtin	Interconnexion	3106	En attente d'éventuelles subventions complémentaires
SE de Berry-au-Bac et Gernicourt	Réhabilitation réservoir	3207	Travaux réalisés en 2015
SE Beaurieux	Interconnexion Roucy, Bouffignereux et Guyencourt	3106	Finalisation des travaux en 2016

Eau potable suite

Maître d'ouvrage	Action	Masse d'eau	Avancement
SE Guignicourt	Mise en œuvre de l'étude AAC	3207	Animation relancée suite à réunion en janvier 2016
SE Guignicourt	Diagnostic du réseau d'eau potable	3207	En cours
CC Pays rethélois	SDAEP	3207	A suivre pour information pendant le contrat
Actions du SDAEP du Soissonnais			A suivre pour information pendant le contrat – Etude finalisée en 2015
Gestion patrimoniale des réseaux	Collectivités	UH	- ½ journée d'information en 2014 - Recrutement stagiaire pour SE Berry-au-Bac et Gernicourt prévu en 2016 - Prestation pour SE de la Région de Beaurieux prévue en 2016

Qualité

Maître d'ouvrage	Action	Masse d'eau	Avancement
Evergnicourt	Suivi du fonctionnement de la station d'épuration	Aisne RS-S	Bilans SATESE bons sauf sur N, Pas d'actions complémentaire à prévoir
Guyencourt	Suivi du fonctionnement de la station d'épuration	Bouffignereux	Lancement mini-diagnostic STEP prévu en 2016
Meurival	Création de réseaux de collecte	Aisne S-V	Attente de décision politique, suite à l'évaluation de l'impact sur le prix de l'eau trop élevé
Meurival	Création de station d'épuration	Aisne S-V	
Saint-Thomas (CC Chemin des Dames)	Réhabilitation des assainissements non collectifs	Ru de Fayau	lancement études parcellaires
Juvincourt-et-Damary	Diagnostic des réseaux de collecte et de la station d'épuration	Miette	En cours
Bouffignereux	Réhabilitation des assainissements non collectifs	Bouffignereux	Etudes préalables en cours
CCVA – Chéry Chartreuve	Réhabilitation des assainissements non collectifs	Orillon	Etudes préalables finalisées, travaux prévus en 2016
Beaurieux	Diagnostic réseaux de collecte et STEP	Aisne S-V	Lancement prévu en 2016
Pontavert	Diagnostic réseaux de collecte et STEP et réhabilitation des puisards	Beaurepaire	Diagnostic STEP réalisé, finalisation travaux des puisards en 2016
CC Canton Oulchy-le-Château	Réhabilitation des assainissements non collectifs	Muze	Zonages prévus pour 2016

Qualité

Actions non inscrites au contrat mais nécessaires à la réhabilitation de l’assainissement non-collectif

Maître d’ouvrage	Action	Masse d’eau	Avancement
Craonnelle	Actualisation du zonage	Beaurepaire	Consultation des entreprises en cours
Aubigny-en-Laonnois	Actualisation du zonage	Ru de Fayau	Relance de la commune

Milieux

Maître d'ouvrage	Action	Masse d'eau	Avancement
FPPMA 02	Restauration de frayères à brochets (Courcelles/Vesle-Limé)	Vesle	Réalisé en 2014
CEN Picardie	Restauration et entretien des marais de Branges et Lhuys	Muze	Programme pluriannuel en cours
SIABAVE	Etude sur la continuité écologique (Ouvrage de la Limerie)	Vesle	Ouvrage de Limerie reporté
SIABAVE	Restauration hydromorphologique	Vesle	Programme pluriannuel en cours, pas de restauration prévue sur la Vesle axonaise en 2016
SIABAVE	Restauration de frayères à brochets	Vesle	3 restaurations prévues en 2016
SIGMAA	Passage en syndicat de BV et travaux en découlant	R202-x du contrat	Poursuite de l'intégration des communes
Collectivités	Travaux de restauration et de gestion des ZH	Toutes	- Pas de projet suite aux réunions de présentation → Stratégie d'intervention à définir - CEN Picardie → Relance commune Concevreux

Animation

Volet	2016
Zones humides	- 2 réunions de présentation restantes de l'étude ZH et des actions pouvant être menées (CEN Picardie) - Sensibilisation sur les ZH via les classes d'eaux scolaires
Rivière	Information sur les opérations soumises à la loi sur l'eau (agriculteurs et élus)
Eau potable	- Réunions d'information sur la protection de la ressource eau potable à destination du grand public en partenariat avec l'ABP Action 2015 non réalisée : à garder ? - Formation des élus : RPQS eau potable A garder ? Traité lors des ½ journées d'information sur facture d'eau et gestion patrimoniale (2014) et lors de la classe d'eau
Phytos en ZNA	Promotion de la boîte à outils « gestion différenciée » AESN / URCPIE réalisée lors de la demi-journée 2015
Agriculture	Actions 2015 non finalisées : - accompagnement des collectivités pour l'introduction de produits bio dans les repas collectifs par l'ABP - organisation de réunions techniques « comment mieux pratiquer? » par l'ABP A garder ? + rencontre élus et agriculteurs clés du territoire (proposé lors du dernier copil)
Artisanat et industrie	Participation aux formations pré-diagnostics des entreprises en partenariat avec la CCI et la CMA
Général	Aide à l'organisation de classes d'eau scolaires ?

Bilan au 1er avril

–

Suites à donner

Bilan au 1er avril

- Tableau de bord financier actualisé au 1er avril

	Type d'actions		Cumul 2016 au 01/04/16		Cumul pluriannuel							
					Travaux Prévisionnel initial		Travaux			Aides AESN		
			Montants de Travaux	Aides AESN (engagées)		Prévisionnel revu au 30/03/16	Engagé	%	% engagé actualisé	Engagé	Payé	%
			(a)	(b)	c	c'	(d)	(d/c)	(d/c')	(f)	(fe)	(fe/f)
LP	**I LUTTE CONTRE LA POLLUTION**											
11*, 12	Assainissement collectif (station et réseau)		25 018 €	20 063 €	700 000 €	68 058 €	62 998 €	9,0%	92,6%	26 118 €	3 608 €	14%
11*	Assainissement non collectif		0 €	0 €	5 230 000 €	5 230 000 €	0 €	0,0%	0,0%	0 €	0 €	/
13	Industrie		/	/	/		/	/	/	/	/	/
14	Elimination des déchets		/	/	/		/	/	/	/	/	/
18	Lutte contre la pollution agricole		/	/	/		/	/	/	/	/	/
	II GESTION DES MILIEUX ET DE LA RESSOURCE											
24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	Etudes	0 €	0 €	610 800 €	246 655 €	11 177 €	9,9%	24,5%	8 942 €	7 154 €	80%
		Restauration de rivière	0 €	0 €			20 800 €			16 640 €	16 000 €	96%
		Restauration de frayères	0 €	0 €			5 855 €			4 099 €	3 982 €	97%
		Entretien des cours d'eau	0 €	0 €			0 €			0 €	0 €	/
		Zones humides	9 780 €	3 912 €			22 696 €			11 853 €	7 617 €	64%
		Ouvrages	0 €	0 €			0 €			0 €	0 €	/
23	Protection de la ressource	Etudes	0 €	0 €	100 000 €	200 000 €	0 €	0,0%	0,0%	0 €	0 €	/
		Travaux	0 €	0 €			0 €			0 €	0 €	/
25	Eau Potable		0 €	0 €	3 391 000 €	2 958 781 €	847 867 €	25,0%	28,7%	343 821 €	208 728 €	61%
	III GOUVERNANCE											
29	Animation		0 €	0 €	883 000 €	285020	152 270 €	28,1%	53,4%	75 332 €	61 691 €	82%
34	Communication		0 €	0 €		95983	95 709 €			67 613 €	55 113 €	82%
32	Suivi milieu- acquisition de donnée		~~0 €~~	~~0 €~~	~~50 000 €~~	~~50 000 €~~	~~0 €~~	~~0,0%~~	~~0,0%~~	0 €	0 €	/
*	une partie de la ligne 11			**TOTAL**	**10 964 800 €**	**9 134 497 €**	**1 219 372 €**	**11%**	**13,3%**	**554 418 €**	**363 893 €**	**66%**

Bilan au 1er avril

Actions	Nombre
Total d'actions	44
Actions 2014- 2016 prévues	27
Actions 2014-2016 sorties :	13
- 2014	7
- 2015	5
- 1er avril 2016	1
Actions prévues avril à fin 2016	8

Montant		%
Total contrat initial	10 964 800 €	
Total contrat actualisé	9 134 497 €	
Montant contrat au 1/04/2016	1 219 372 €	13,3%
Prévisionnel fin 2016	3 331 480 €	36 %

Proche des 40%, mais à fin 2016, un peu plus que la mi-contrat (septembre 2016)

Questions diverses

Questions et infos diverses

- Elus : Réunion d'information de l'URCPIE :
« Zéro-phyto dans les espaces verts et les espaces de loisirs (terrains de sport, ...)» à Hirson le **mardi 7 juin**

- Agriculteurs : point d'information par l'ABP :
« Aides applicables à l'agriculture biologique en Picardie » à Merlieux-et-Fouquerolles (02) le **mardi 19 avril**

Des questions ?

s.i.a.ba.ve.

Merci de votre attention
